



Bestaande bosstrook naast het Bargerkanaal



Zichtzijde vanaf het Phileas Foggstraat op bestaand hekwerk

AANLEG BOSPLANTSOEN
terrein spitten met spltmachine, daar planten volgens
schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband
(Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
te jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting
druv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant te gefaseerde
dunning, zgn. wijkers en bilvers.
het eindresultaat is een dichte singel met enkele
uitgegroeide bomen met daarop
een gevarieerde onderbeplanting die
gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

ONDERHOUD STRUWEEL
te jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting
druv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant te gefaseerde
dunning, zgn. wijkers en bilvers, +/- 30% afzetten
het eindresultaat is een dicht struweel met voldoende
gevarieerde beplanting en leef tijd.

Te planten Symphoricarpos 450m2 3st/m2 = 1350st.

lat. naam ned. naam
Symphoricarpos "Hancock" Sneeuwbes

definitieve plaats bepalen in het werk;
- Er is nog een strook aanwezig die evt niet nieuw
geplant hoeft te worden
- plantlocatie goed losmaken/doorspitten
- aanplanten in driehoeksverband +/- 35cm2
- aanplanten +/- 50cm uit het hekwerk

Te planten Struweelhagen 550m 3 rijen 1st/m2 1650st.

lat. naam ned. naam aant.
Grateagus monogyna Meidoorn 200
Rosa canina Hondsroos 100
Prunus spinosa Sleedoorn 450
Viburnum opulus Gelderse roos 500
Ligustrum vulgare Liguster 450
Ilex aquifolium gewone hulst 200

definitieve plaats bepalen in het werk;
- plantlocatie goed losmaken/doorspitten
- aanplanten in driehoeksverband +/- 35cm
- aanplanten +/- 50cm uit het hekwerk

2000st te planten bosplantsoen 100/120cm
lat. naam ned. naam aant. waar geplant
Sorbus aucuparia Lijsterbes 100
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 200 in groepen in midden
Betula pendula Berk 200 in groepen door gehele aanplant
Quercus robur Eik 200 in groepen in midden
Amelancier lamarckii Krent 200 in groepen door gehele aanplant
Prunus spinosa Sleedoorn 200 in groepen aan randen
Corylus avellana Hazelaar 200 in groepen door gehele aanplant
Ligustrum vulgare Liguster 100 in groepen aan randen
Viburnum opulus Gelderse roos 200 in groepen aan randen

ENTREE

AANPLANT BOMEN
plantgaten 1x1m losmaken voorzien
van 0,1m3 GFTcompost en
1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dam)
voorzien van 2 onbehandelde boompalen
en drainage/lucht/achtergeef slang

ONDERHOUD BOMEN

te jaar evt. watergeven. in droge periodes,
tevens schoonhouden boomspiegel
in het 3e/4e jaar na aanplant te vormsnij
en controle boomtoppen

ENTREE

Te planten Bomen
lat. naam ned. naam aant. Maat
Sophora japonica Honingboom 4 16/18
Acer rubrum Rode esdoorn 5 16/18

Te planten Hagen
lat. naam ned. naam aant. Maat
Carpinus betulus Hoogbeuk 250 100/120

definitieve plaats bomen, bepalen in het werk;
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.

Hagen definitieve plaats bepalen in het werk;
- plantlocatie goed losmaken en voorzien van compost (GFT)
- te planten 5st. per meter
- voorzien van haagmeststof (Ecostyle o.g.)

Te planten mengsel vaste planten/siergrassen
zgn. Fleur robuste

definitieve sortiment nader te bepalen +/- 500m2 aan beplanting
Ondergrond goed losspitten en voorzien van compost (GFT)
goed doorwerken voor aanplant

Voorbeeld van mooie solitaire bomen
voor bij de entree
Acer rubrum en Sophora japonica



Enkele voorbeeldsorten
van sterke beplanting
t.b.v. een fleurige entree
(zgn. Fleur robuste) def. sortiment
nader te bepalen

Bestaande
bosstrook
handhaven

Bestaande bosstrook
handhaven en versterken
tot een breedte van 10meter

Bestaande bomenrij
(rijen Lindes)

"Gat" in de bestaande bosstrook
weer opnieuw aanplanten

Zicht vanaf de N862. Bestaande rij Lindes en
aanwezige bosstrook neemt het zicht volledig weg

Vergisting installatie

Zonnepanelen

Waterstof elektrolyser

Waterstof tankstation

Aanwezige bomenrij
(Pinus) kappen ivm
panelen

Nieuw aan te planten gemengde
struweelhaag langs bestaande hekwerk
Door waar mogelijk een minimale breedte 2,5m
aan de binnenzijde


Bestaand
hekwerk te
handhaven

Aanwezig groenstrook van Symphoricarpos
doortrekken tot aan de zonnepanelen.
Door waar het toelaat de groenstrook
verbreiden tot minimaal 2,5 meter

Entree "opfleuren" en accentueren
met nieuwe beplanting
zgn. "Fleur robuste" en 9st. nieuwe bomen

Aanwezig groenstrook van Symphoricarpos
doortrekken tot panelen.
Door waar mogelijk, de beplantingsstrook
verbreiden tot 2,5 meter

Bestaand
hekwerk te
handhaven

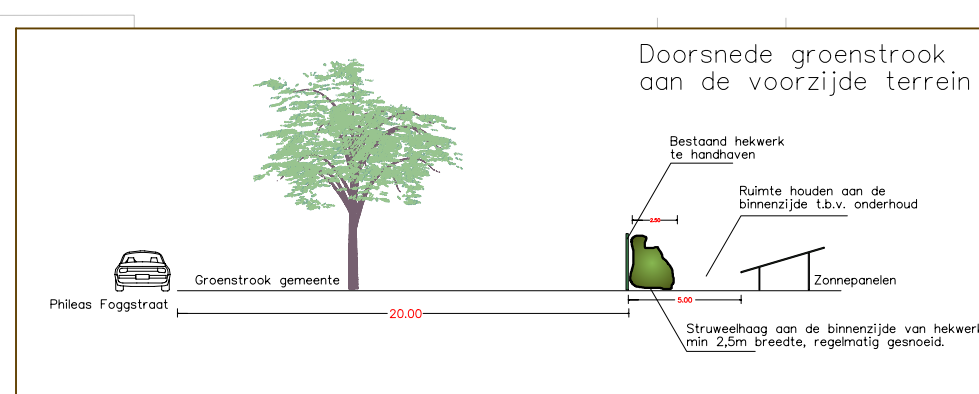

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Werk
GZI Next - North star Biovergister

Onderwerp
Definitieve
Landschappelijke inpassingsvoorstel

Datum
22-12-2022

Schaal
A0 1:1000

Getek.
